


安全点検チェックシート II-1			
班		点検者	

(1) 第三者災害防止措置

	番	点検項目	点検箇所 No.					備考
			1	2	3	4	5	
公衆災8	①	近隣居住者等への周知は実施されているか。	<input type="checkbox"/>					
公衆災11,13,24	②	第三者への危険が予想される場合、適切な配置で柵等を設けているか。	<input type="checkbox"/>					
公衆災16	③④	出入口の施錠があり、構造・措置は適切か。	<input type="checkbox"/>					
公衆災10	⑤	強風等により倒壊しない強度を有しているか。	<input type="checkbox"/>					
公衆災10	⑥	作業場に第三者の出入りを禁止する措置をしているか。	<input type="checkbox"/>					
	⑦	工事関係車両出入口の看板等は設置されているか。	<input type="checkbox"/>					
	⑧	ガードマンは適切に配置しているか。	<input type="checkbox"/>					
	⑨	通行を開放している箇所の段差は、段差対策と注意喚起等をしているか。	<input type="checkbox"/>					
	⑩	一般車両が通行する箇所の段差対策をしているか。	<input type="checkbox"/>					
	⑪	歩行者の通行に危険な箇所には、危険表示等をしているか。	<input type="checkbox"/>					
	⑫	看板、標識類は所定の場所に安全かつ通行を妨げとにならないよう設置し、常に点検整備をしているか。また、道路照明柱などの道路付属物にくくりつけて設置する場合、柱等が適切に養生されているか。	<input type="checkbox"/>					
	⑬	夜間に車両や歩行者が通行する場所には保安灯(回転灯,スズラン,投光器,仮設信号機)等を適切な配置で設置しているか。	<input type="checkbox"/>					
騒音規制法14 振動規制法14	⑭	特定建設作業の届け出の義務を守っているか。	<input type="checkbox"/>					
道路交通法45	⑮	工事関係者の違法駐車はないか。道路上に設置した作業場内に、作業に使用しない車両を駐車していないか。	<input type="checkbox"/>					

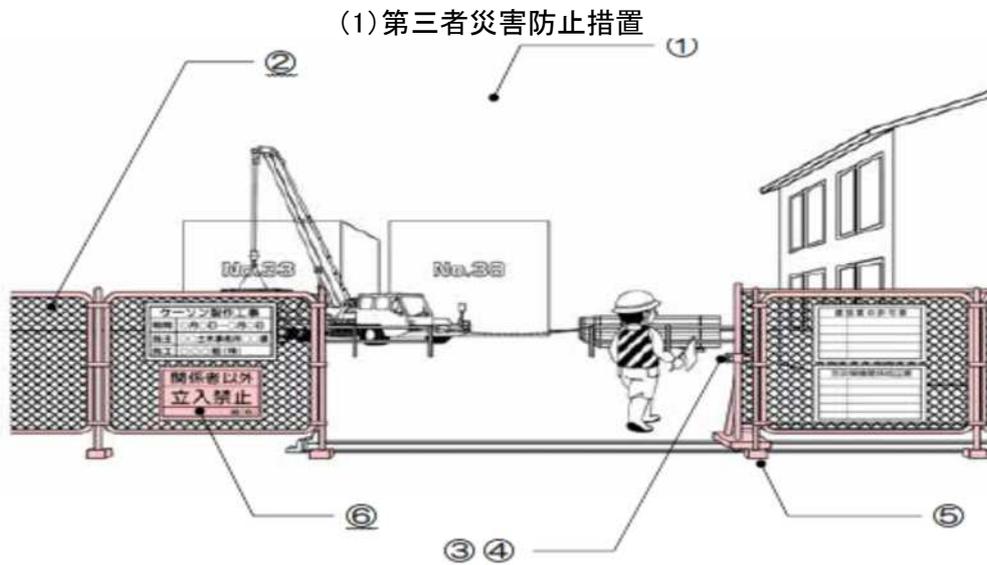

□ 特定建設作業の実施の届け出

特定建設作業を行おうとする場合は、施工者は、作業開始の7日前までに、騒音規制法第14条、あるいは振動規制法第14条に沿って実施の届け出を、当該作業を行おうとする地域が位置する都道府県知事へ届け出ることが求められる。

なお、届出の内容は、以下の通りである。

- ① 名称及び住所並びに代用者氏名
- ② 建設工事の目的にかかる施設の種類
- ③ 場所及び実施の期間、時刻
- ④ 騒音・振動の防止の方法
- ⑤ 作業場所の付近の見取図その他

※ 特定建設作業とは、「騒音規制法第2条」「振動規制法第2条」のそれぞれに定義されているとおり、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音、あるいは振動を発生する作業であって、令別表第2により定められているものをいう。

安全点検チェックシートⅡ-2

班		点検者	
---	--	-----	--

(2)A型標準図 車道打ち換え・オーバーレイ・AS注入 4車線以上 夜間(昼間)作業 局部打ち換え含


番	点検項目	点検箇所 No.					備考
		1	2	3	4	5	
①	標識、看板、表示板、カラーコーン、仮設信号機等を転倒しないように留意して設置しているか。	<input type="checkbox"/>					
②	工事予告看板を各現場の状況に応じ、適切に設置にしているか。	<input type="checkbox"/>					
③	工事区域内の範囲は適切な範囲にしているか。	<input type="checkbox"/>					
④	工事用照明灯は500W/灯以上6m(標準間隔)になっているか。	<input type="checkbox"/>					
⑤	保安要員1名以上、交通整理員2名以上おいているか。	<input type="checkbox"/>					
⑥	標識車又は大型電光掲示板を設置しているか。	<input type="checkbox"/>					
⑦	工事情報看板は道路工事を開始する1週間前から道路工事を開始するまでの間、設置しているか。	<input type="checkbox"/>					

(2)A型標準図

A型標準図

車道打換(局部打換も含む)
オーバーレイ
As注入

: 4車線以上 : 夜間(昼間)

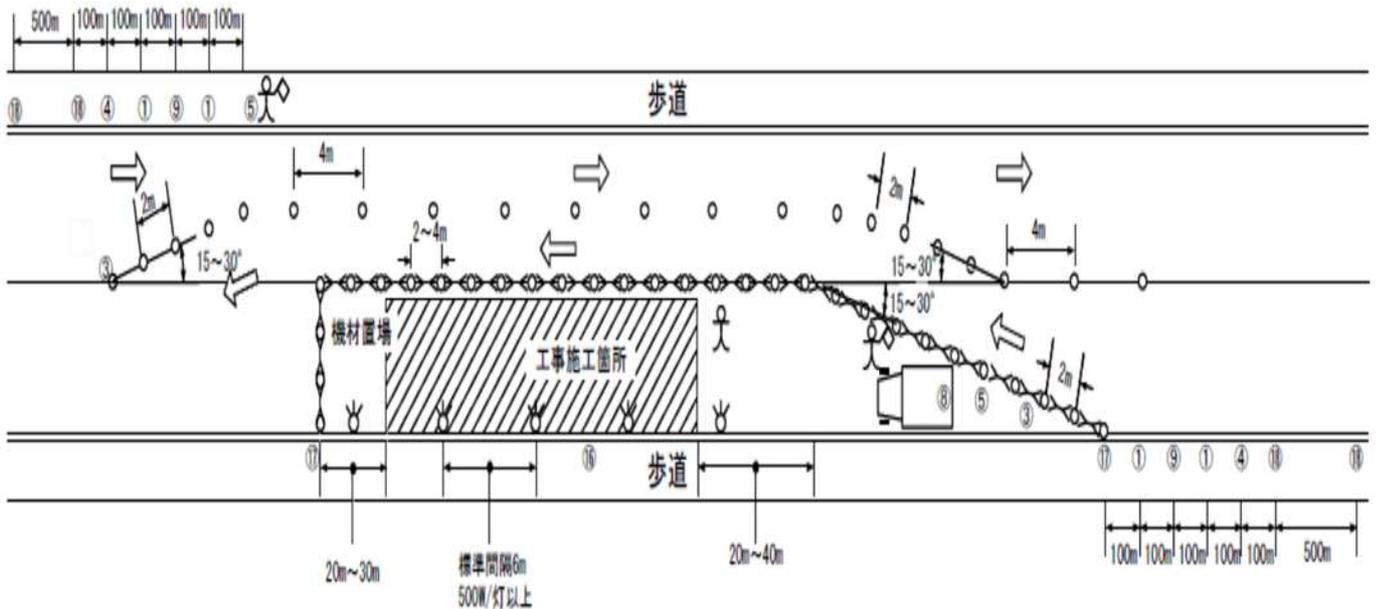

- 注) 1 保安要員1名以上、交通整理員2名以上おくこと。
 2 歩道境界のバリケードはガードレールがある場合は除く。また、現場の状況によりロープに変えてもよい。
 3 昼間工事の場合は⑧を②④に変更することができる。
 4 カラーコーンの設置間隔及び設置角度は当該警察署と協議すること。
 5 ⑧は標識車又は大型電光掲示板を設置すること。
 6 近接して工事が行われる場合、①及び⑧は各工事間で調整を行い設置すること。
 7 ⑩は工事開始の1週間前から工事開始までの間、設置すること。
 8 必要に応じてクッションドラム、体感マット、交通誘導ロボットを設置すること。
 9 工期と延長がある道路工事等については、車両の通行速度を抑制し事故防止を図るため、特に工区内において、「速度落とせ・徐行」「段差注意」「歩行者通路」等の注意喚起看板を通行者の視認性を考慮し適切に設置すること。


安全点検チェックシート II-3

班		点検者	
---	--	-----	--

(3)B型標準図 車道打ち換え・オーバーレイ・AS注入 4車線未満 夜間(昼間)作業 局部打ち換え含							
番	点検項目	点検箇所 No.					備考
		1	2	3	4	5	
①	標識、看板、表示板、カラーコーン、仮設信号機等を転倒しないように留意して設置しているか。	<input type="checkbox"/>					
②	工事予告看板を工事予告看板を各現場の状況に応じ、適切に設置しているか。	<input type="checkbox"/>					
③	工事区域内の範囲は適切な範囲にしているか。	<input type="checkbox"/>					
④	工事に用照明灯は500W/灯以上6m(標準間隔)になっているか。	<input type="checkbox"/>					
⑤	保安要員1名以上、交通整理員2名以上おいているか。	<input type="checkbox"/>					
⑥	標識車又は大型電光掲示板を設置しているか。	<input type="checkbox"/>					
⑦	工事情報看板は道路工事を開始する1週間前から道路工事を開始するまでの間、設置しているか。	<input type="checkbox"/>					

(3)B型標準図

B 型標準図 車道打換(局部打換も含む) : 4車線未満 : 夜間(昼間)
 オーバーレイ
 As注入

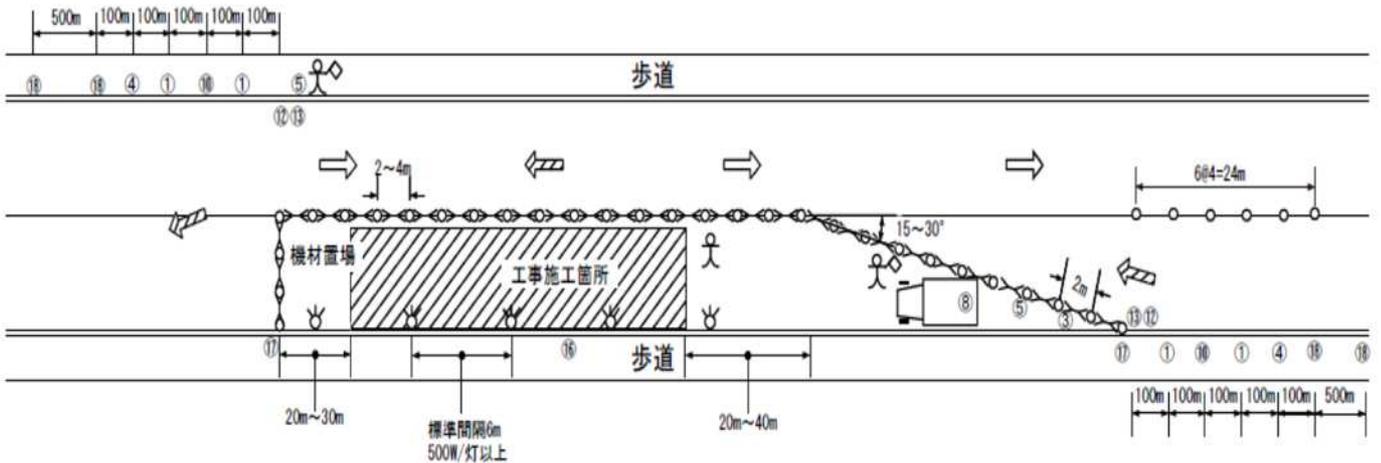

- 注) 1 保安要員1名以上、交通整理員2名以上おくこと。
 2 歩道境界のバリケードはガードレールがある場合は除く。また、現場の状況によりロープに変えてもよい。
 3 昼間工事の場合は⑧を②④に変更することができる。
 4 現地の状況により信号機を使用することができる。
 5 カラーコーンの設置間隔及び設置角度は当該警察署と協議すること。
 6 ⑧は標識車又は大型電光表示板を設置すること。
 7 近接して工事が行われる場合、①及び⑱は各工事間で調整を行い設置すること。
 8 ⑱は工事開始の1週間前から工事開始までの間、設置すること。
 9 必要に応じてクッションドラム、体感マット、交通誘導ロボットを設置すること。
 # 工期と延長がある道路工事等については、車両の通行速度を抑制し事故防止を図るため、特に工区内において、「速度落とせ・徐行」「段差注意」「歩行者通路」等の注意喚起看板を通行者の視認性を考慮し適切に設置すること。

安全点検チェックシート II-4

班		点検者	
---	--	-----	--

(4)C型標準図 車道打ち換え・オーバーレイ・AS注入 4車線以上 夜間(昼間)作業 局部打ち換え含


番	点検項目	点検箇所 No.					備考
		1	2	3	4	5	
①	標識、看板、表示板、カラーコーン、仮設信号機等を転倒しないように留意して設置しているか。	<input type="checkbox"/>					
②	工事予告看板を工事予告看板を各現場の状況に応じ、適切に設置にしているか。	<input type="checkbox"/>					
③	工事区域内の範囲は適切な範囲にしているか。	<input type="checkbox"/>					
④	工事中照明灯は500W/灯以上6m(標準間隔)になっているか。	<input type="checkbox"/>					
⑤	保安要員及び交通整理員をそれぞれ1名以上おいているか。	<input type="checkbox"/>					
⑥	標識車又は大型電光掲示板を設置しているか。	<input type="checkbox"/>					
⑦	工事情報看板は道路工事を開始する1週間前から道路工事を開始するまでの間、設置しているか。	<input type="checkbox"/>					

(4)C型標準図

C型標準図

車道打換(局部打換も含む)
オーバーレイ
As注入

: 4車線以上 : 夜間(昼間)

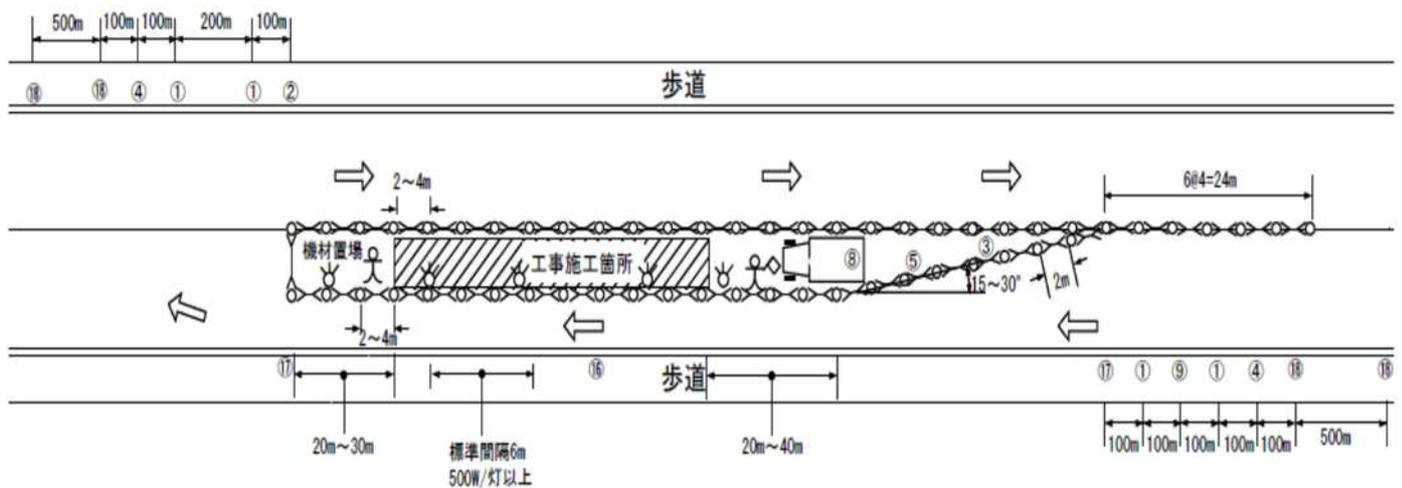

- 注) 1 保安要員及び交通整理員をそれぞれ1名以上おくこと。
 2 昼間工事の場合は⑧を②④に変更することができる。
 3 カラーコーンの設置間隔及び設置角度は当該警察署と協議すること。
 4 ⑧は標識車又は大型電光掲示板を設置すること。
 5 近接して工事が行われる場合、①及び⑧は各工事間で調整を行い設置すること。
 6 ⑧は工事開始の1週間前から工事開始までの間、設置すること。
 7 必要に応じてクッションドラム、体感マット、交通誘導ロボットを配置すること。
 8 工期と延長がある道路工事等については、車両の通行速度を抑制し事故防止を図るため、特に工区内において、「速度落とせ・徐行」「段差注意」「歩行者通路」等の注意喚起看板を通行者の視認性を考慮し適切に設置すること。

安全点検チェックシート II-5

班		点検者	
---	--	-----	--


(5)D型標準図 中央分離帯修理、設置 夜間(昼間)作業

番	点検項目	点検箇所 No.					備考
		1	2	3	4	5	
①	標識、看板、表示板、カラーコーン、仮設信号機等を転倒しないように留意して設置しているか。	<input type="checkbox"/>					
②	工事予告看板を工事予告看板を各現場の状況に応じ、適切に設置にしているか。	<input type="checkbox"/>					
③	工事区域内の範囲は適切な範囲にしているか。	<input type="checkbox"/>					
④	工食用照明灯は500W/灯以上6m(標準間隔)になっているか。	<input type="checkbox"/>					
⑤	保安要員及1名以上、交通整理員2名以上おているか。	<input type="checkbox"/>					
⑥	標識車又は大型電光掲示板を設置しているか。	<input type="checkbox"/>					
⑦	工事情報看板は道路工事を開始する1週間前から道路工事を開始するまでの間、設置しているか。	<input type="checkbox"/>					

(5)D型標準図

D型標準図

中央分離帯修理、設置：夜間(昼間)

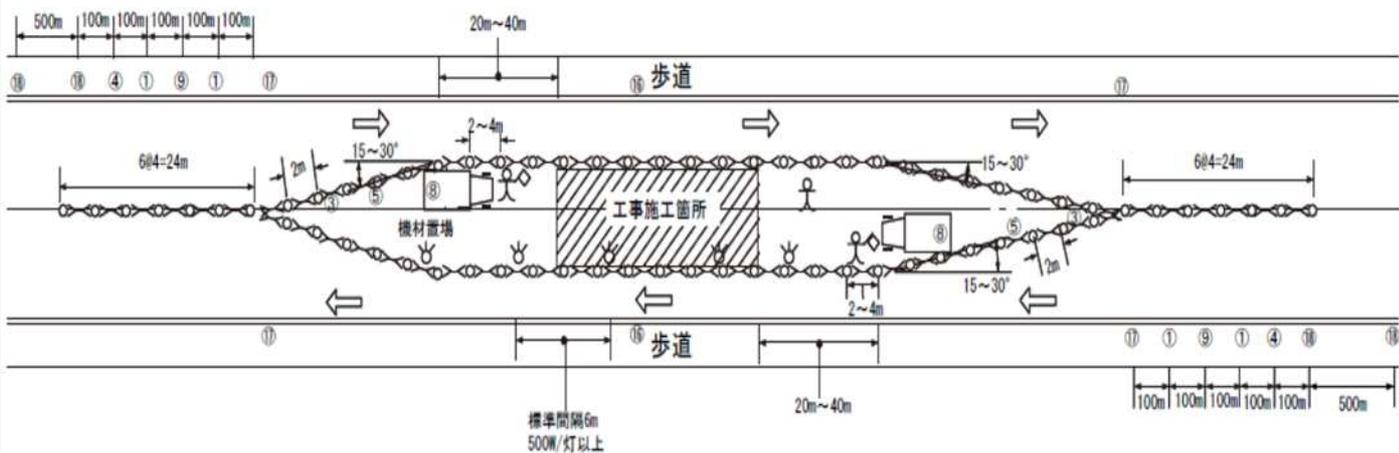

- 注) 1 保安要員1名以上、交通整理員2名以上おくこと。
 2 昼間工事の場合は⑧を②④に変更することができる。
 3 カラーコーンの設置間隔及び設置角度は当該警察署と協議すること。
 4 ⑧は標識車又は大型電光掲示板を設置すること。
 5 近接して工事が行われる場合、①及び⑧は各工事間で調整を行い設置すること。
 6 ⑧は工事開始の1週間前から工事開始までの間、設置すること。
 7 必要に応じてクッションドラム、体感マット、交通誘導ロボットを配置すること。
 8 工期と延長がある道路工事等については、車両の通行速度を抑制し事故防止を図るため、特に工区内において、「速度落とせ・徐行」「段差注意」「歩行者通路」等の注意喚起看板を通行者の視認性を考慮し適切に設置すること。

安全点検チェックシート II-6			
班		点検者	


(6)E型標準図 歩道工事 夜間(昼間)作業

番	点検項目	点検箇所 No.					備考
		1	2	3	4	5	
①	標識、看板、表示板、カラーコーン、仮設信号機等を転倒しないように留意して設置しているか。	<input type="checkbox"/>					
②	工事予告看板を工事予告看板を各現場の状況に応じ、適切に設置にしているか。	<input type="checkbox"/>					
③	工事区域内の範囲は適切な範囲にしているか。	<input type="checkbox"/>					
④	工事用照明灯は500W/灯以上6m(標準間隔)になっているか。	<input type="checkbox"/>					
⑤	保安要員及1名以上、交通整理員3名以上おているか。	<input type="checkbox"/>					
⑥	標識車又は大型電光掲示板を設置しているか。	<input type="checkbox"/>					
⑦	工事情報看板は道路工事を開始する1週間前から道路工事を開始するまでの間、設置しているか。	<input type="checkbox"/>					
⑧	歩行者通行幅は原則として1.5m以上確保しているか。	<input type="checkbox"/>					

(6)E型標準図

E 型標準図

歩道工事：夜間(昼間)

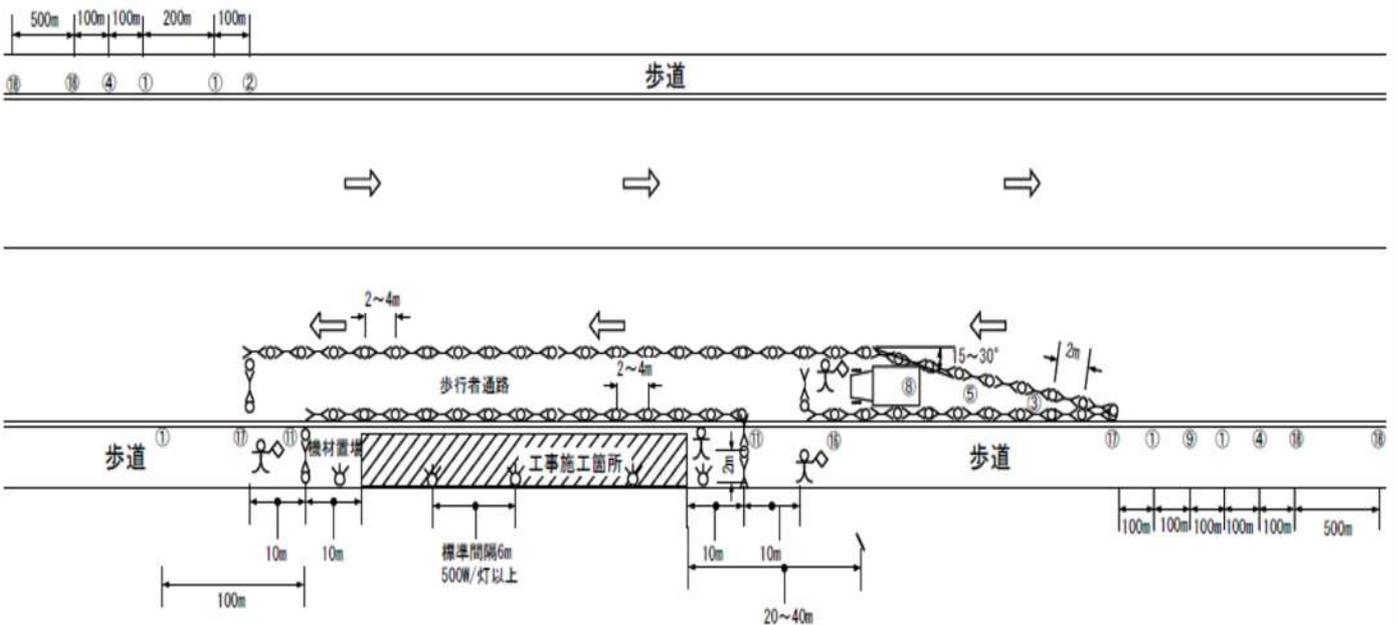

- 注) 1 歩行者通行幅は原則として1.5m以上確保すること。
 2 保安要員1名以上、交通整理員3名以上おくこと。
 3 昼間工事の場合は⑧を②④に変更することができる。
 4 カラーコーンの設置間隔及び設置角度は当該警察署と協議すること。
 5 ⑧は標識車又は大型電光掲示板を設置すること。
 6 近接して工事が行われる場合、①及び⑱は各工事間で調整を行い設置すること。
 7 ⑰は工事開始の1週間前から工事開始までの間、設置すること。
 8 必要に応じてクッションドラム、体感マット、交通誘導ロボットを設置すること。
 9 工期と延長がある道路工事等については、車両の通行速度を抑制し事故防止を図るため、特に工区内において、「速度落とせ・徐行」「段差注意」「歩行者通路」等の注意喚起看板を通行者の視認性を考慮し適切に設置すること。

安全点検チェックシート II-7			
班		点検者	


(7)F型標準図 ガードレール、標識、街渠等の設置修繕 夜間(昼間)作業

番	点検項目	点検箇所 No.					備考
		1	2	3	4	5	
①	標識、看板、表示板、カラーコーン、仮設信号機等を転倒しないように留意して設置しているか。	<input type="checkbox"/>					
②	工事予告看板を工事予告看板を各現場の状況に応じ、適切に設置にしているか。	<input type="checkbox"/>					
③	工事区域内の範囲は適切な範囲にしているか。	<input type="checkbox"/>					
④	工事中照明灯は500W/灯以上6m(標準間隔)になっているか。	<input type="checkbox"/>					
⑤	保安要員及1名以上、交通整理員3名以上おいているか。	<input type="checkbox"/>					
⑥	標識車又は大型電光掲示板を設置しているか。	<input type="checkbox"/>					
⑦	工事情報看板は道路工事を開始する1週間前から道路工事を開始するまでの間、設置しているか。	<input type="checkbox"/>					
⑧	歩行者通行幅は原則として1.5m以上確保しているか。	<input type="checkbox"/>					


(7)F型標準図

F 型標準図

ガードレール、標識、街渠等の設置修繕:夜間(昼間)



歩道

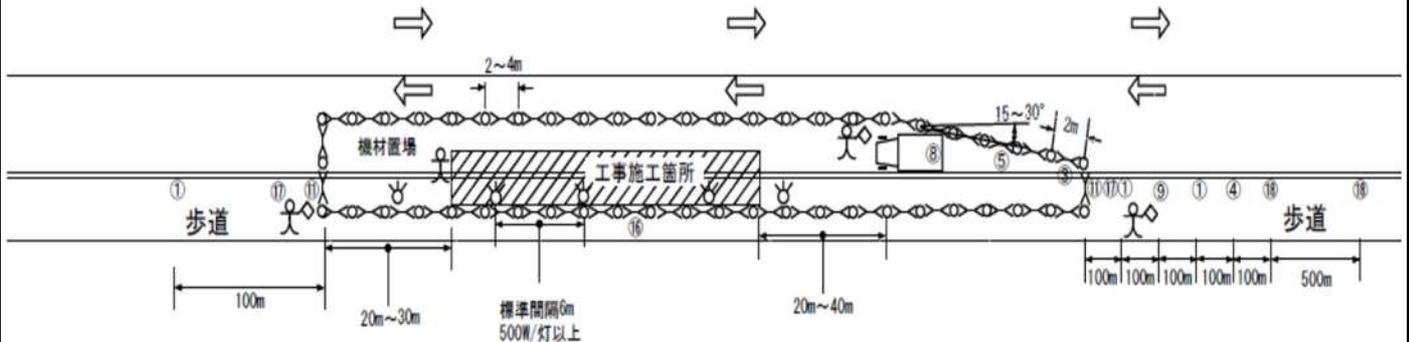

- 注) 1 歩行者通行幅は原則として1.5m以上確保すること。
 2 保安要員1名以上、交通整理員3名以上おくこと。
 3 昼間工事の場合は⑧を②④に変更することができる。
 4 カラーコーンの設置間隔及び設置角度は当該警察署と協議すること。
 5 ⑧は標識車又は大型電光掲示板を設置すること。
 6 近接して工事が行われる場合、①及び⑧は各工事間で調整を行い設置すること。
 7 ⑧は工事開始の1週間前から工事開始までの間、設置すること。
 8 必要に応じてクッションドラム、体感マット、交通誘導ロボットを設置すること。
 9 工期と延長がある道路工事等については、車両の通行速度を抑制し事故防止を図るため、特に工区内において、「速度落とせ・徐行」「段差注意」「歩行者通路」等の注意喚起看板を通行者の視認性を考慮し適切に設置すること。

安全点検チェックシート II-8			
班		点検者	

(8) G型標準図 除草、ガードレール等の人力清掃、路肩整理 昼間作業

番	点検項目	点検箇所 No.					備考
		1	2	3	4	5	
①	標識、看板、表示板、カラーコーン、仮設信号機等を転倒しないように留意して設置しているか。	<input type="checkbox"/>					
②	工事予告看板を各現場の状況に応じ、適切に設置にしているか。	<input type="checkbox"/>					
③	工事区域内の範囲は適切な範囲にしているか。	<input type="checkbox"/>					
④	警戒標識、規制標識は原則として作業車に張り付けているか。	<input type="checkbox"/>					
⑤	保安要員及1名以上、交通整理員1名以上おいているか。	<input type="checkbox"/>					

(8) G型標準図


G 型標準図

除草、ガードレール等の人力清掃、路肩整理：昼間作業

注：標識②③は作業車に張り付けることを原則とする。
「〇〇作業中」は「除草作業中」等と標示する。



歩道

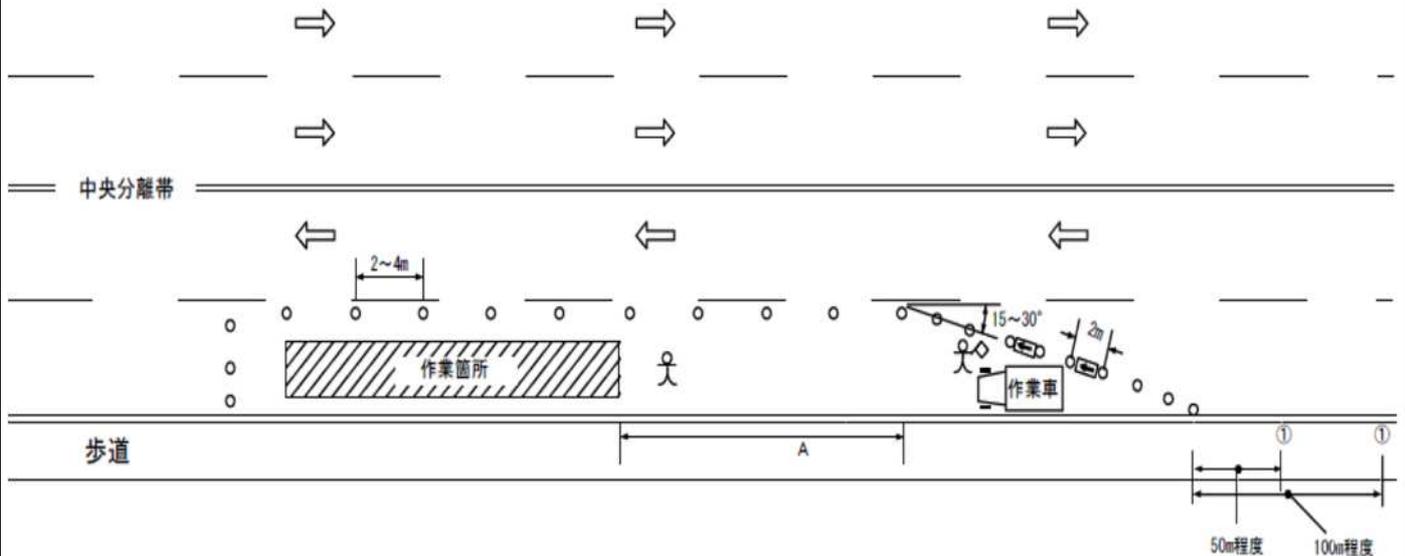

- 注) 1 移動用
 2 Aの距離については通行車両の走行速度及び沿道状況を勘案して確保する。
 (Aについては30m程度を標準とする。この範囲に作業員は立ち入らないこと。)
 3 保安要員1名以上、交通整理員1名以上おくこと。
 4 カラーコーンの設置間隔及び設置角度は当該警察署と協議すること。
 5 右下の①の設置数については交通量その他、現地の状況によって定めること。
 6 工期と延長がある道路工事等については、車両の通行速度を抑制し事故防止を図るため、特に工区内において、「速度落とせ・徐行」「段差注意」「歩行者通路」等の注意喚起看板を通行者の視認性を考慮し適切に設置すること。

安全点検チェックシート II-9

班		点検者	
---	--	-----	--

(9)H型標準図 路面及び側溝の人力清掃 昼間作業

番	点検項目	点検箇所 No.					備考
		1	2	3	4	5	
①	標識、看板、表示板、カラーコーン、仮設信号機等を転倒しないように留意して設置しているか。	<input type="checkbox"/>					
②	工事予告看板を現場の状況に応じ、適切に設置にしているか。	<input type="checkbox"/>					
③	工事区域内の範囲は適切な範囲にしているか。	<input type="checkbox"/>					
④	警戒標識、規制標識は原則として作業車に張り付けているか。	<input type="checkbox"/>					
⑤	保安要員及1名以上、交通整理員1名以上おいているか。	<input type="checkbox"/>					

(9)H型標準図


H型標準図

路面および側溝の人力清掃：昼間作業

注：標識②③は作業車に張りつけることを原則とする。
「〇〇作業中」は「清掃作業中」等と標示する。



歩道

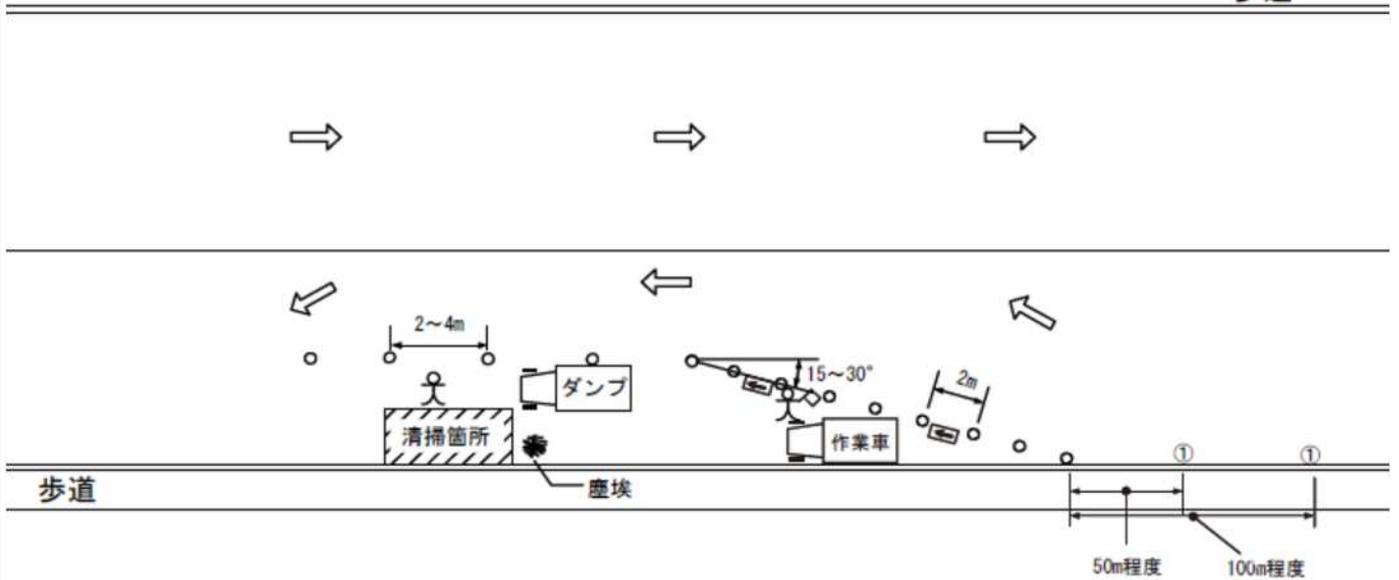

- 注) 1 移動用
- 2 保安要員1名以上、交通整理員1名以上おくこと。
- 3 カラーコーンの設置間隔及び設置角度は当該警察署と協議すること。
- 4 右下の①の設置数については交通量その他、現地の状況によって定めること。
- 5 工期と延長がある道路工事等については、車両の通行速度を抑制し事故防止を図るため、特に工区内において、「速度落とせ・徐行」「段差注意」「歩行者通路」等の注意喚起看板を通行者の視認性を考慮し適切に設置すること。


安全点検チェックシート II-10			
班		点検者	

(10)I型標準図 目地シール作業等(短時間作業) 昼間作業							
番	点検項目	点検箇所 No.					備考
		1	2	3	4	5	
①	標識、看板、表示板、カラーコーン、仮設信号機等を転倒しないように留意して設置しているか。	<input type="checkbox"/>					
②	規制標識速度落とせ看板を400m手前に設置しているか。	<input type="checkbox"/>					
③	工事区域内の範囲は適切な範囲にしているか。	<input type="checkbox"/>					
④	警戒標識、規制標識は原則として作業車に張り付けているか。	<input type="checkbox"/>					
⑤	保安要員及1名以上、交通整理員3名以上おいているか。	<input type="checkbox"/>					

(10)I型標準図

I 型標準図

目地シール作業等(短時間作業): 昼間作業

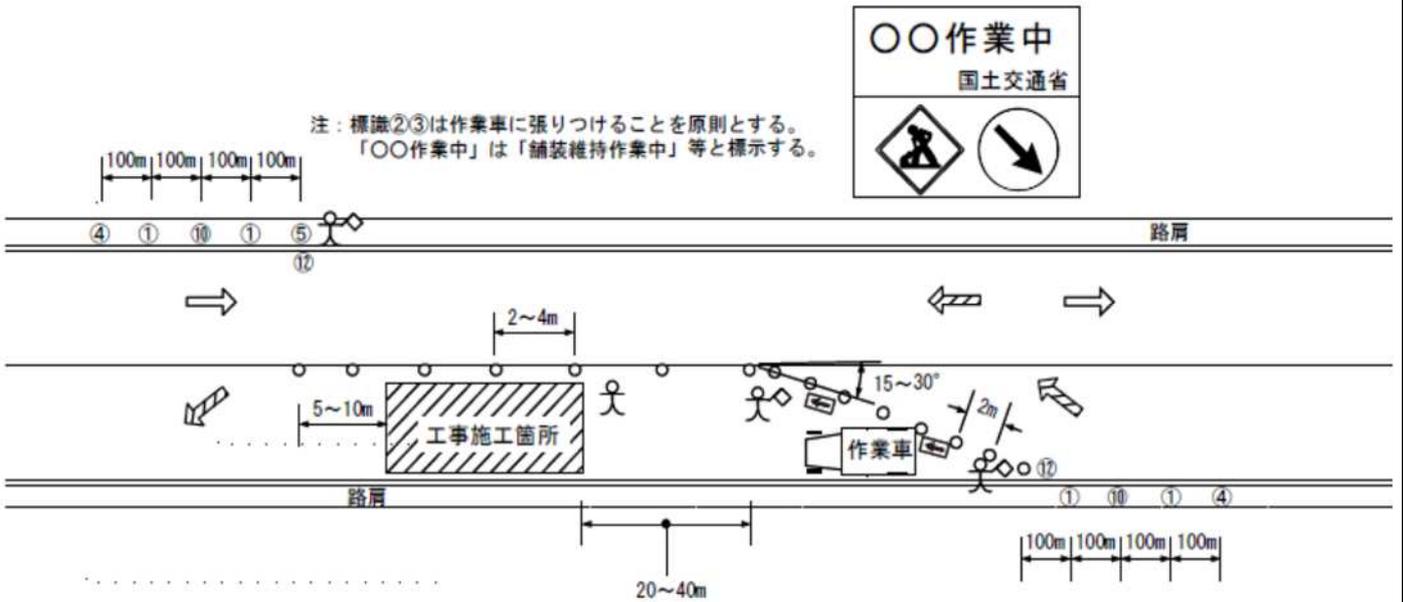

- 注) 1 移動用
 2 保安要員1名以上、交通整理員3名以上おくこと。
 3 カラーコーンの設置間隔及び設置角度は当該警察署と協議すること。
 4 工期と延長がある道路工事等については、車両の通行速度を抑制し事故防止を図るため、特に工区内において、「速度落とせ・徐行」「段差注意」「歩行者通路」等の注意喚起看板を通行者の視認性を考慮し適切に設置すること。

安全点検チェックシート II-11		
班		点検者


(11)J型標準図 レーンマーク作業 昼間作業							
番	点検項目	点検箇所 No.					備考
		1	2	3	4	5	
①	標識、看板、表示板、カラーコーン、仮設信号機等を転倒しないように留意して設置しているか。	<input type="checkbox"/>					
②	工事区域内の範囲は適切な範囲にしているか。	<input type="checkbox"/>					
③	警戒標識、規制標識は原則として作業車に張り付けているか。	<input type="checkbox"/>					
④	保安要員及1名以上、交通整理員2名以上おいているか。	<input type="checkbox"/>					
⑤	先導車を使用しているか。	<input type="checkbox"/>					

(11)J型標準図

J型標準図

レーンマーク作業：昼間作業

注：標識②③は作業車に張りつけることを原則とする。
「〇〇作業中」は「区画線作業中」等と標示する。



- 注) 1 移動用
 2 作業実施には原則として警察官立会いの上施工し、広幅員の場合には防護用作業車を使用のこと。
 3 先導車を使用すること。
 4 保安要員1名以上、交通整理員2名以上おくこと。
 5 カラーコーンの設置間隔は当該警察署と協議すること。
 6 工期と延長がある道路工事等については、車両の通行速度を抑制し事故防止を図るため、特に工区内において、「速度落とせ・徐行」「段差注意」「歩行者通路」等の注意喚起看板を通行者の視認性を考慮し適切に設置すること。
