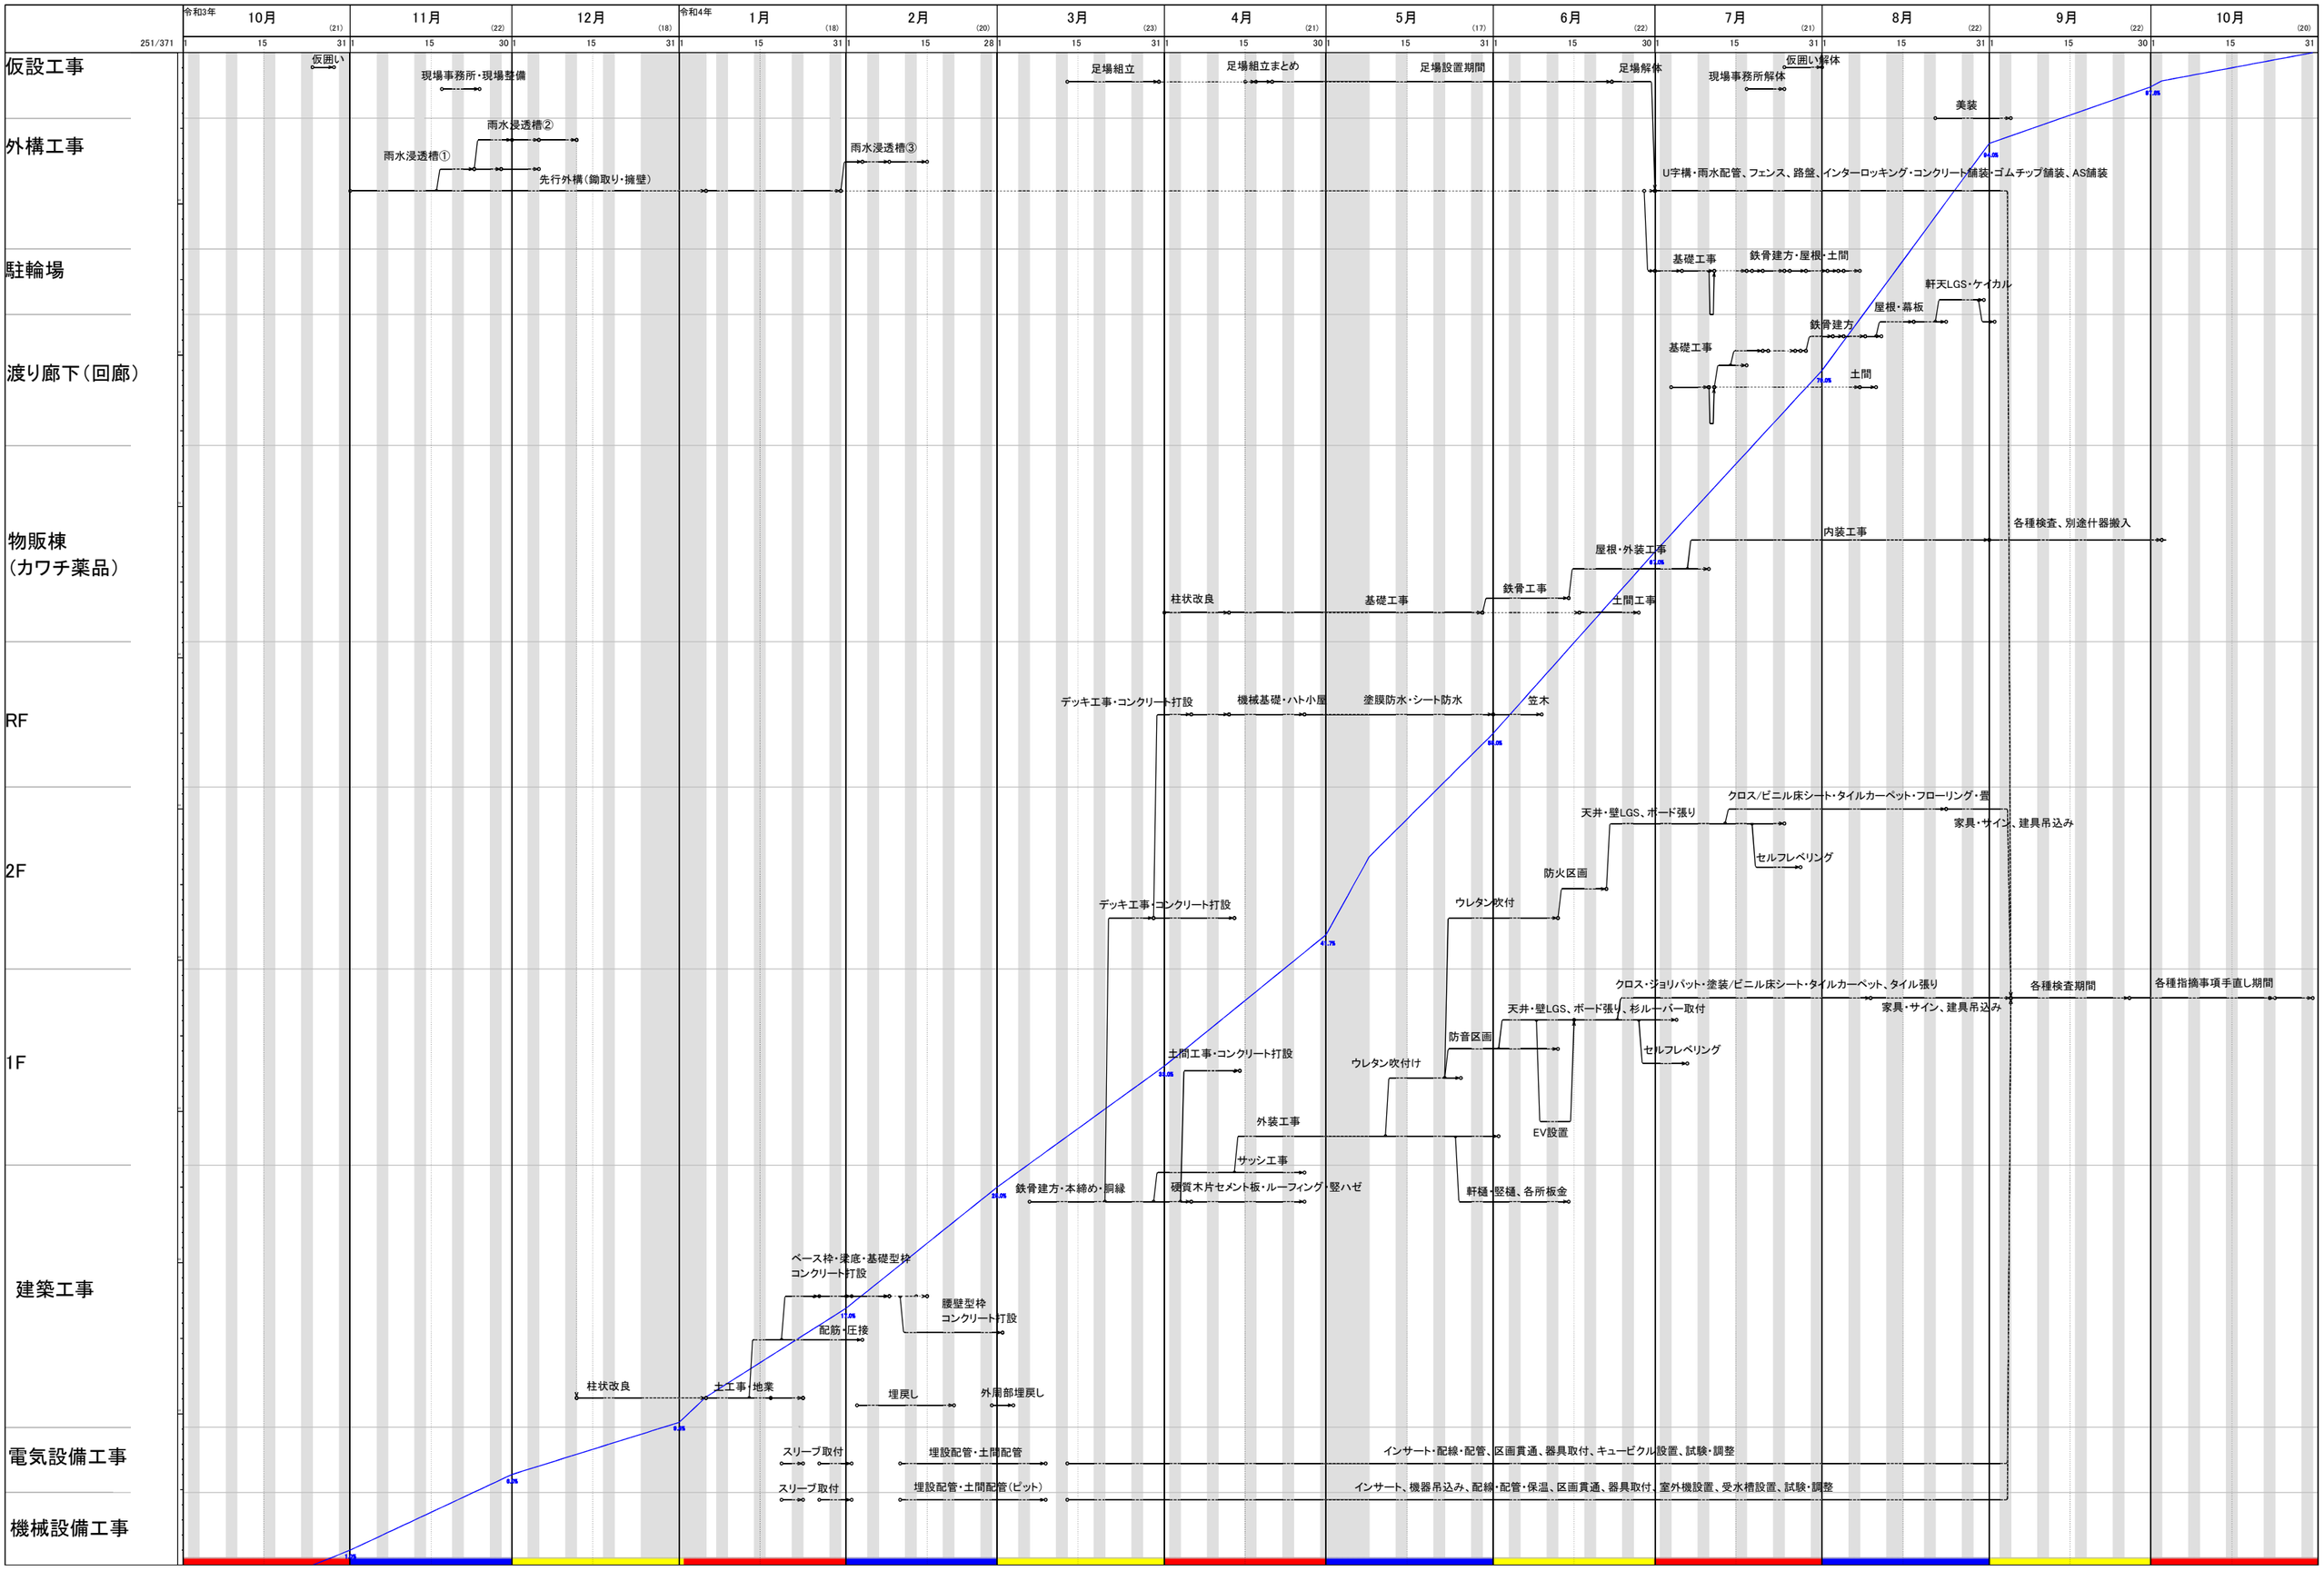
令和3年
10月
11月
12月
令和4年
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
251/371
仮設工事
外構工事
駐輪場
渡り廊下（回廊）
物販棟
（カワチ薬品）
RF
2F
1F
建築工事
電気設備工事
機械設備工事
仮囲い
現場事務所・現場整備
雨水浸透槽②
雨水浸透槽①
先行外構（鋤取り・擁壁）
雨水浸透槽③
足場組立
足場組立まとめ
足場設置期間
足場解体
仮囲い解体
現場事務所解体
美装
U字構・雨水配管、フェンス、路盤、インターロッキング・コンクリート舗装・ゴムチップ舗装、AS舗装
基礎工事
鉄骨建方・屋根・土間
軒天LGS・ケイカル
屋根・幕板
鉄骨建方
土間
内装工事
各種検査、別途什器搬入
屋根・外装工事
鉄骨工事
土間工事
柱状改良
基礎工事
デッキ工事・コンクリート打設
機械基礎・ハト小屋
塗膜防水・シート防水
笠木
クロス/ビニル床シート・タイルカーペット・フローリング・畳
天井・壁LGS、ボード張り
家具・サイン、建具吊込み
セルフレベリング
防火区画
ウレタン吹付
デッキ工事・コンクリート打設
クロス・ジョリパット・塗装/ビニル床シート・タイルカーペット、タイル張り
各種検査期間
各種指摘事項手直し期間
天井・壁LGS、ボード張り、杉ルーバー取付
家具・サイン、建具吊込み
防音区画
セルフレベリング
土間工事・コンクリート打設
ウレタン吹付け
外装工事
EV設置
サッシ工事
鉄骨建方・本締め・胴縁
硬質木片セメント板・ルーフィング・竪ハゼ
軒樋・竪樋、各所板金
ベース枠・梁底・基礎型枠
コンクリート打設
腰壁型枠
コンクリート打設
配筋・圧接
柱状改良
土工事・地業
埋戻し
外周部埋戻し
スリーブ取付
埋設配管・土間配管
インサート・配線・配管、区画貫通、器具取付、キュービクル設置、試験・調整
スリーブ取付
埋設配管・土間配管（ピット）
インサート、機器吊込み、配線・配管・保温、区画貫通、器具取付、室外機設置、受水槽設置、試験・調整
